


Baustelleninfo
Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein

2018 KW 02

Verteiler
 Baukommission
 Schulleitung
 Medienverantwortliche
 Fachplaner

Arbeiten	Thema	Unternehmer
Lüftungsarbeiten	Schule, 2.Obergeschoss, Lüftungsanlage fertiggestellt Schule, 1.Obergeschoss, Lüftungsanlage fertiggestellt Schule, Erdgeschoss, Montage der Anlage	Wintsch
Bodenbelagsarbeiten	Schule, Fertigstellung Vinylboden im 2.OG Schule, Beginn mit Bodenbelagsarbeiten im 1.OG	Pfister
Wandverkleidungen	Schule, Montage Schränke etc. im 2. - 1.OG	Gläser Wogg
Inneneinrichtung	Schule, Fertigstellung Fensterbänke im 2.OG	Vogel Design
Wandschränke	KIGA, Fertigstellung bis Ende KW 2	Bard
Deckenbekleidung	Schule, 2.Obergeschoss fertiggestellt. KIGA, Metaldecken in den Nasszonen eingebaut.	Pro Ausbau
Umgebung	Schule, Innenhof, Beginn mit Umgebungsarbeiten KIGA, Spielplatz fertiggestellt.	Marti

Wetterprognose

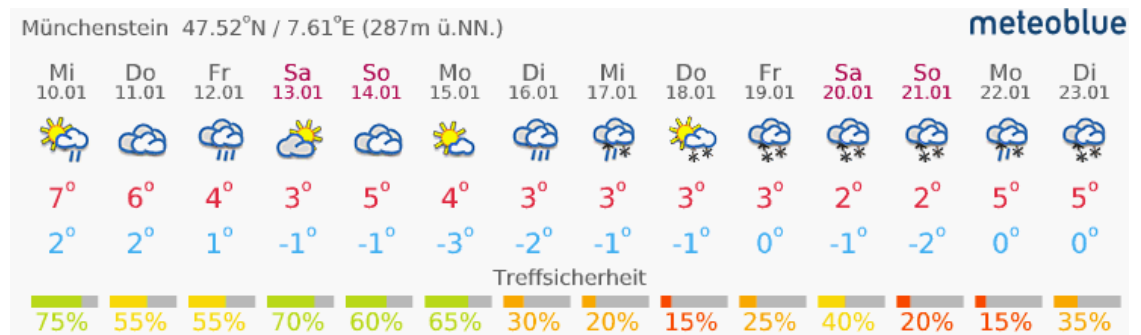

Schule, 2.OG, Boden-, Deckenbelag, Schrankfront und Fenstersims



Schule, 2.OG, Wandverkleidungen, Schrankfronten



Schule, 2.OG, Deckenbekleidung, Türrahmen und Fensterbank

