

**Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 11.07.2016 – 17.07.2016 KW 28**


**Verteiler**  
 Baukommission  
 Schulleitung  
 Medienverantwortliche  
 Fachplaner  
 Unternehmer

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
--------------------	-------	-------------

**Arbeiten ab 11.07.2016 KW 28**


Baustelleninstall.	Fertigstellung der Bauwände + Bauplatzinstallation	ERNE AG
Roden/Rückbau	Beginn Rückbau Hauswartsgebäude	Wenger Knecht
Dekontamination	Rückbau Boden UG und Pausenplatz	Dekonta
Installationen	Demontage und prov. Lagerung Schaltschrank Hauswartsgebäude Leitungen füllen für Heizung.	Laubi Innovent

**Wetterprognose**

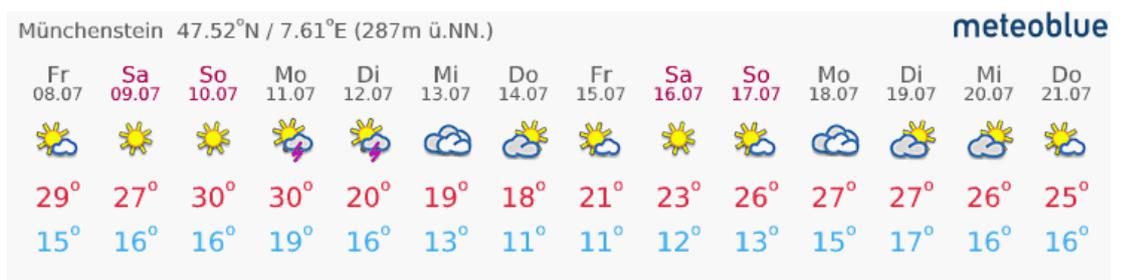

Die Bauleitung **Adrian Hänggi**  
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein,

Provisorische Leitungsführung

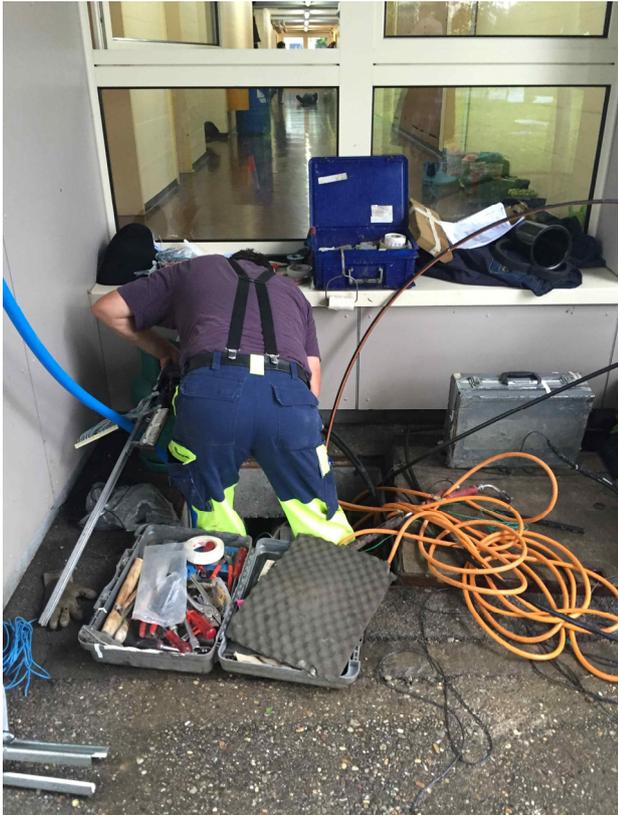

Baustellenzufahrt - Oberwilerstrasse



Bauplatzinstallation / Rückbau Eternitfassade

