


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 29.08.2017 – 05.09.2017 KW 35/36

Verteiler
Baukommission
Schulleitung
Medienverantwortliche
Fachplaner

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Allgemein	Aufrichtung am 01.09.2017	Alle
Elektro	KIGA, EG und 1.OG, Fertigmontage Steckdosen etc. Elektro	Jaisli Xamax
Plattenarbeiten	Fertigstellung Fugen Plattenarbeiten im KIGA EG	Bernasconi
Fenster	Schule, Montage aller Fensterflügel	Baumgartner
Fassade	Schule, Montage Zargen für Fassadenelemente	Roland Salm
Brandabschottung	Schule, Beginn mit Brandabschottungen im gesamten Schulhaus.	Brunner
Ausbesserungen	Schule, sichtbare Ausbesserungen an den Sichtbetonwänden	Finish Serv.
Umgebung	Erstellen der Gräben für EBM, Zuleitungen Wasser und Elektro etc.	Knecht

Wetterprognose

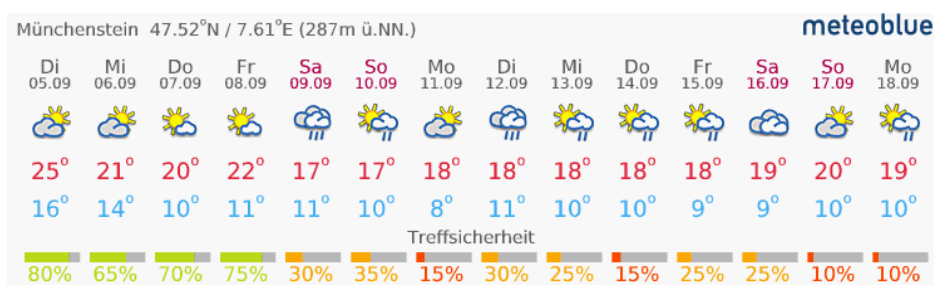

Adrian Hänggi
Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

KIGA, EG, Nasszonen Fugen



KIGA, EG, Plattenbelag



KIGA



Umgebung, Bauplatz

